PT PLN (PERSERO) PUSHARLIS
UNIT PELAKSANA PRODUKSI DAN WORKSHOP III
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 | e-mail: pusharlis@pln.co.id

LAPORAN HASIL INSPEKSI NDT

No. Inspeksi	: #54	Inspector	: admin
Tanggal Inspeksi	: 15 Oktober 2026, 11:03 WIB	Unit Asal	: PLTU
Jenis Benda	: Bearing	Standar Acuan	: Standard
Diameter	: 38,00 mm	Tanggal Cetak	: 20 Oktober 2026
Zona Komponen	: Upper	Dicetak Oleh	: admin

1. Ringkasan Hasil

STATUS ZONA A
ACCEPT

STATUS ZONA C
REJECT

STATUS AKHIR
REJECT

Melebihi batas toleransi, komponen ditolak (REJECT).


2. Perhitungan

Parameter Geometri	Nilai
Panjang Keliling (P)	59,69 mm
Luas Babbit Total	1.432,57 mm²

Parameter	Zona A	Zona C
Luas Zona	378,67 mm²	1.053,89 mm²
Total Unbond	0,00 mm²	312,00 mm²
Luas Bond	378,67 mm²	741,89 mm²
Persentase Unbond	0,00 %	42,05 %
Batas Toleransi Persentase	maks. 20,00 %	maks. 20,00 %
Status Persentase	ACCEPT	REJECT
Indikasi Terbesar	0,00 mm	312,00 mm²
Batas Indikasi Individu	maks. 10,00 mm	maks. 21,08 mm²
Status Indikasi Individu	ACCEPT	REJECT
Status Zona	ACCEPT	REJECT

PT PLN (PERSERO) PUSHARLIS
UNIT PELAKSANA PRODUKSI DAN WORKSHOP III
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 | e-mail: pusharlis@pln.co.id

3. Gambar Hasil Mapping

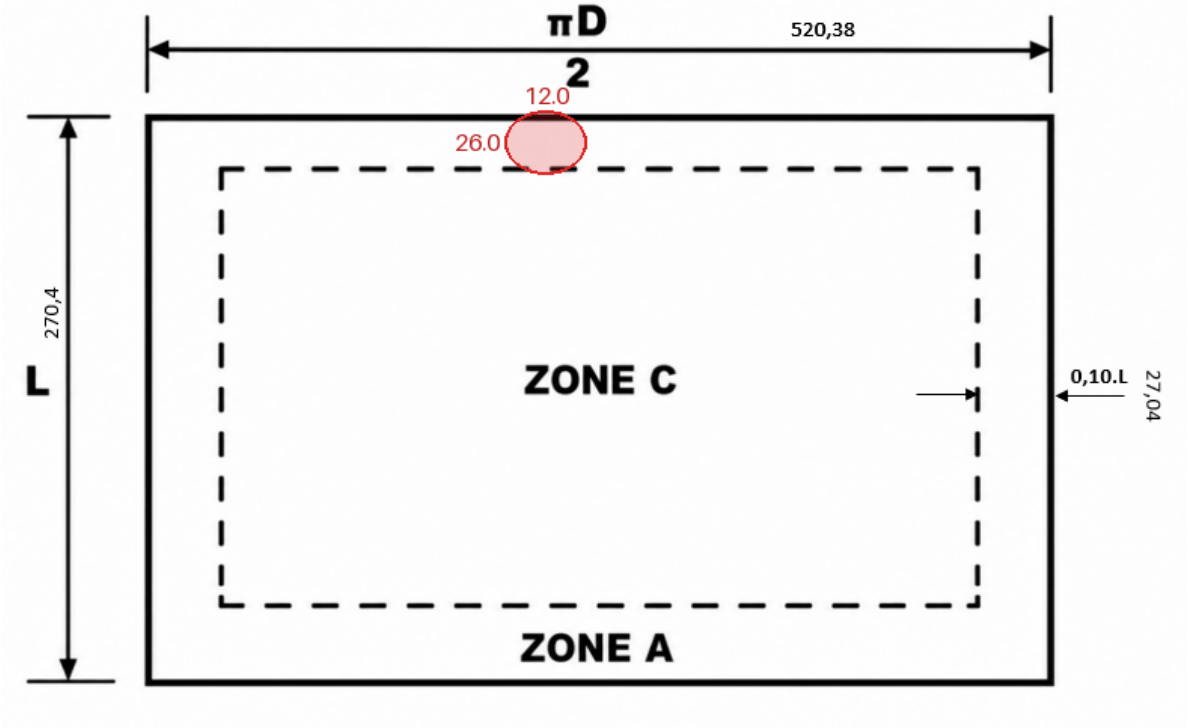

Elips merah = posisi indikasi; angka di atas = panjang (mm), angka di kiri = lebar (mm), angka di tengah = nomor indikasi.

4. Daftar Indikasi

No	Zona	Panjang (mm)	Lebar (mm)	Luas (mm²)	Foto Bukti
1	C	12,00	26,00	312,00	

Jumlah indikasi: 1 | Total luas Zona A: 0,00 mm² | Total luas Zona C: 312,00 mm²

CHECKED BY TL QUALITY CONTROL	CHECKED BY TL QUALITY CONTROL	CHECKED BY TL QUALITY CONTROL
BAGUS SANJAYA PUTRA	**BAGUS SANJAYA PUTRA**	**BAGUS SANJAYA PUTRA**
